Franklin Jr High Site Improve Schedule Gantt

PCC
PO BOX 1000
Lee's Summit 64081
P: (855) 697-4194

Franklin Jr High Site Improve
10440 Indian Creek S Road
Indianapolis 46259
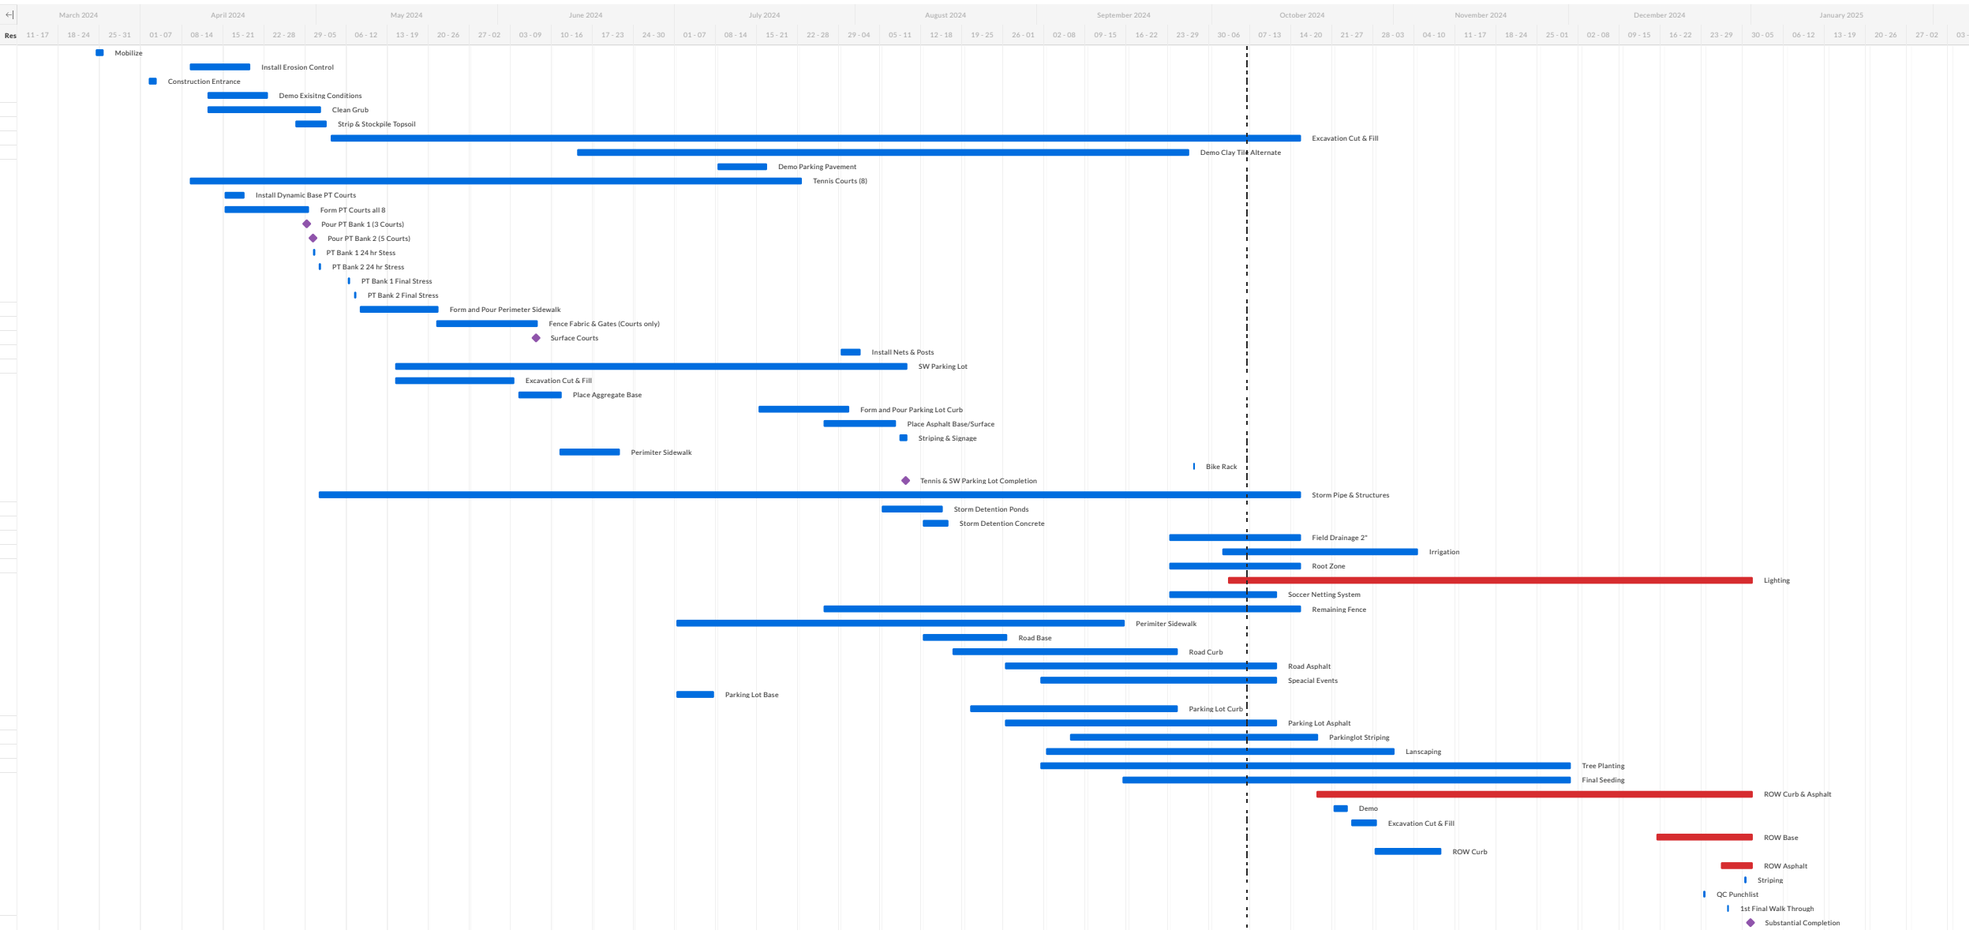
ID	Task Name	Start	Finish	Duration	% Complete	Res
1	Mobilize	03/24/2024	03/25/2024	2 d	100%	
2	Install Erosion Control	04/09/2024	04/19/2024	9 d	100%	
3	Construction Entrance	04/02/2024	04/03/2024	2 d	100%	
4	Demo Exisitng Conditions	04/12/2024	04/22/2024	7 d	100%	
5	Clean Grub	04/12/2024	05/01/2024	14 d	100%	
6	Strip & Stockpile Topsoil	04/27/2024	05/02/2024	5 d	100%	
7	Excavation Cut & Fill	05/03/2024	10/15/2024	118 d	90%	
8	Demo Clay Tile Alternate	06/14/2024	09/26/2024	75 d	100%	
9	Demo Parking Pavement	07/08/2024	07/16/2024	7 d	100%	
10	Tennis Courts (8)	04/09/2024	07/22/2024	75 d	100%	
11	Install Dynamic Base PT Courts	04/15/2024	04/18/2024	4 d	100%	
12	Form PT Courts all 8	04/15/2024	04/29/2024	11 d	100%	
13	Pour PT Bank 1 (3 Courts)	04/29/2024	04/29/2024	0 d	100%	
14	Pour PT Bank 2 (5 Courts)	04/30/2024	04/30/2024	0 d	100%	
15	PT Bank 1 24 hr Stess	04/30/2024	04/30/2024	1 d	100%	
16	PT Bank 2 24 hr Stress	05/01/2024	05/01/2024	1 d	100%	
17	PT Bank 1 Final Stress	05/06/2024	05/06/2024	1 d	100%	
18	PT Bank 2 Final Stress	05/07/2024	05/07/2024	1 d	100%	
19	Form and Pour Perimeter Sidewalk	05/08/2024	05/21/2024	10 d	100%	
20	Fence Fabric & Gates (Courts only)	05/21/2024	06/07/2024	14 d	100%	
21	Surface Courts	06/07/2024	06/07/2024	0 d	100%	
22	Install Nets & Posts	07/29/2024	08/01/2024	4 d	100%	
23	SW Parking Lot	05/14/2024	08/09/2024	64 d	100%	
24	Excavation Cut & Fill	05/14/2024	06/03/2024	15 d	100%	
25	Place Aggregate Base	06/04/2024	06/11/2024	6 d	100%	
26	Form and Pour Parking Lot Curb	07/15/2024	07/30/2024	12 d	100%	
27	Place Asphalt Base/Surface	07/26/2024	08/07/2024	9 d	100%	
28	Striping & Signage	08/08/2024	08/09/2024	2 d	100%	
29	Perimiter Sidewalk	06/11/2024	06/21/2024	9 d	100%	
30	Bike Rack	09/27/2024	09/27/2024	1 d	100%	
31	Tennis & SW Parking Lot Completion	08/09/2024	08/09/2024	0 d	100%	
32	Storm Pipe & Structures	05/01/2024	10/15/2024	120 d	90%	
33	Storm Detention Ponds	08/05/2024	08/15/2024	9 d	100%	
34	Storm Detention Concrete	08/12/2024	08/16/2024	5 d	100%	
35	Field Drainage 2"	09/23/2024	10/15/2024	17 d	20%	
36	Irrigation	10/02/2024	11/04/2024	24 d	20%	
37	Root Zone	09/23/2024	10/15/2024	17 d	20%	
38	Lighting	10/03/2024	12/31/2024	64 d	10%	
39	Soccer Netting System	09/23/2024	10/11/2024	15 d	50%	
40	Remaining Fence	07/26/2024	10/15/2024	58 d	75%	
41	Perimiter Sidewalk	07/01/2024	09/15/2024	56 d	100%	
42	Road Base	08/12/2024	08/26/2024	11 d	100%	
43	Road Curb	08/17/2024	09/24/2024	28 d	100%	
44	Road Asphalt	08/26/2024	10/11/2024	35 d	40%	
45	Speacial Events	09/01/2024	10/11/2024	31 d	50%	
46	Parking Lot Base	07/01/2024	07/07/2024	6 d	100%	
47	Parking Lot Curb	08/20/2024	09/24/2024	26 d	100%	
48	Parking Lot Asphalt	08/26/2024	10/11/2024	35 d	40%	
49	Parkinglot Striping	09/06/2024	10/18/2024	31 d	0%	
50	Lanscaping	09/02/2024	10/31/2024	44 d	50%	
51	Tree Planting	09/01/2024	11/30/2024	67 d	0%	
52	Final Seeding	09/15/2024	11/30/2024	57 d	0%	
53	ROW Curb & Asphalt	10/18/2024	12/31/2024	53 d	0%	
54	Demo	10/21/2024	10/23/2024	3 d	0%	
55	Excavation Cut & Fill	10/24/2024	10/28/2024	3 d	0%	
56	ROW Base	12/15/2024	12/31/2024	13 d	0%	
57	ROW Curb	10/28/2024	11/08/2024	10 d	0%	
58	ROW Asphalt	12/26/2024	12/31/2024	4 d	0%	
59	Striping	12/30/2024	12/30/2024	1 d	0%	
60	QC Punchlist	12/23/2024	12/23/2024	1 d	0%	
61	1st Final Walk Through	12/27/2024	12/27/2024	1 d	0%	
62	Substantial Completion	12/31/2024	12/31/2024	0 d	0%
