Franklin Jr High Site Improve Schedule Gantt

PCC
PO BOX 1000
Lee's Summit 64081
P: (855) 697-4194
F: (855) 697-4194

Franklin Jr High Site Improve
10440 Indian Creek S Road
Indianapolis 46259
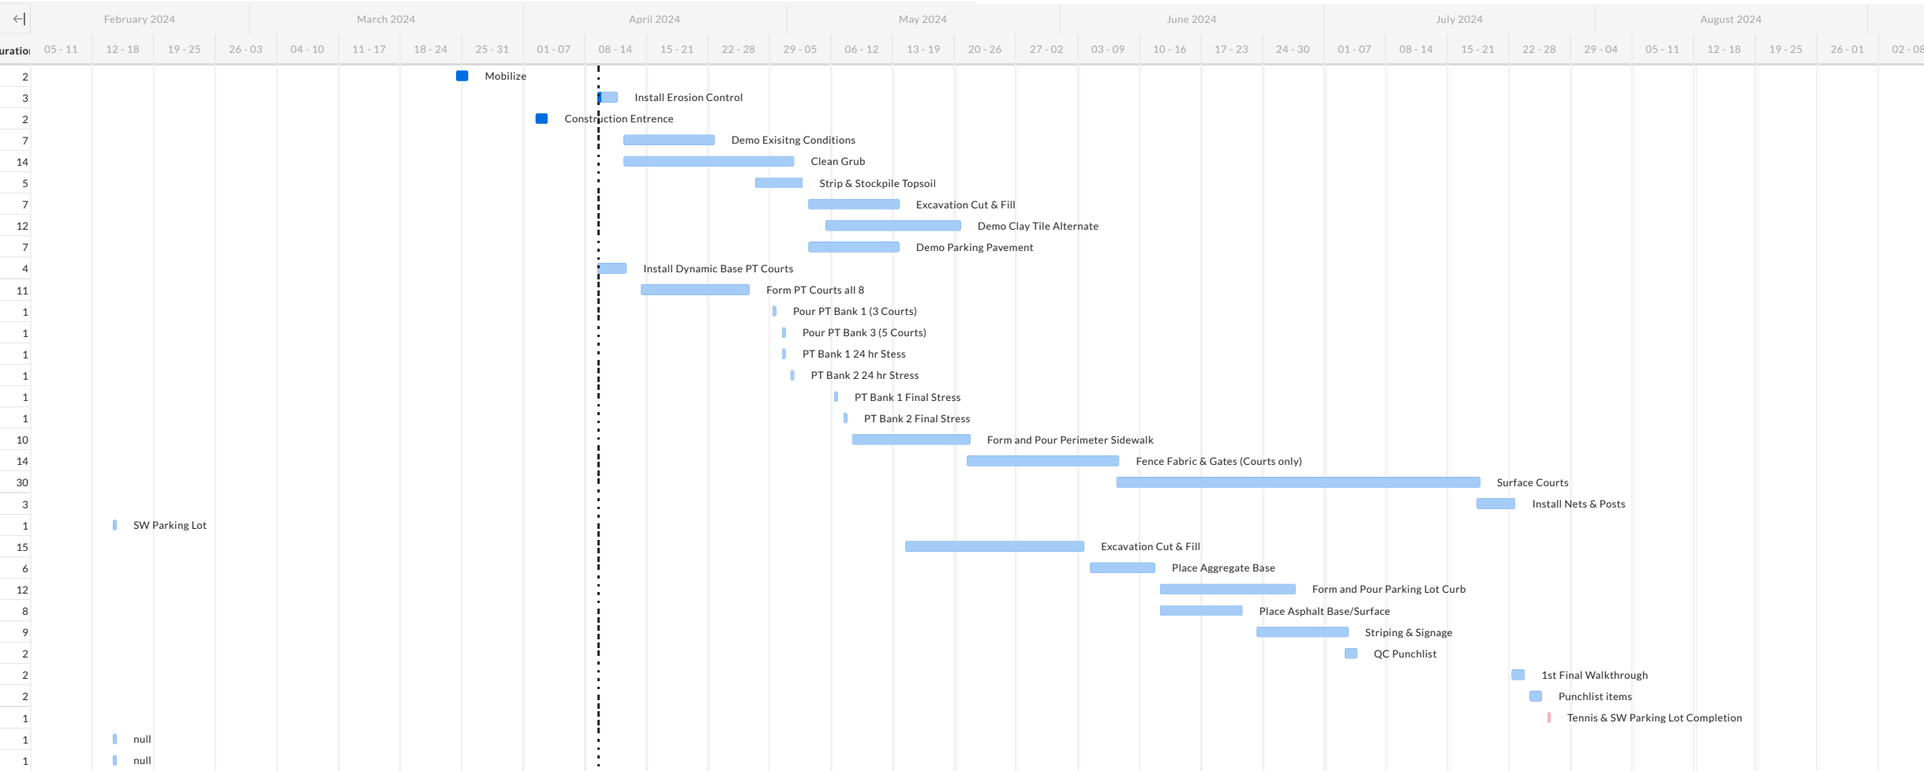
ID	Task Name	Start	Finish	Duratio
1	Mobilize	03/24/2024	03/25/2024	2
2	Install Erosion Control	04/09/2024	04/11/2024	3
3	Construction Entrence	04/02/2024	04/03/2024	2
4	Demo Exisitng Conditions	04/12/2024	04/22/2024	7
5	Clean Grub	04/12/2024	05/01/2024	14
6	Strip & Stockpile Topsoil	04/27/2024	05/02/2024	5
7	Excavation Cut & Fill	05/03/2024	05/13/2024	7
8	Demo Clay Tile Alternate	05/05/2024	05/20/2024	12
9	Demo Parking Pavement	05/03/2024	05/13/2024	7
10	Install Dynamic Base PT Courts	04/09/2024	04/12/2024	4
11	Form PT Courts all 8	04/14/2024	04/26/2024	11
12	Pour PT Bank 1 (3 Courts)	04/29/2024	04/29/2024	1
13	Pour PT Bank 3 (5 Courts)	04/30/2024	04/30/2024	1
14	PT Bank 1 24 hr Stess	04/30/2024	04/30/2024	1
15	PT Bank 2 24 hr Stress	05/01/2024	05/01/2024	1
16	PT Bank 1 Final Stress	05/06/2024	05/06/2024	1
17	PT Bank 2 Final Stress	05/07/2024	05/07/2024	1
18	Form and Pour Perimeter Sidewalk	05/08/2024	05/21/2024	10
19	Fence Fabric & Gates (Courts only)	05/21/2024	06/07/2024	14
20	Surface Courts	06/07/2024	07/18/2024	30
21	Install Nets & Posts	07/18/2024	07/22/2024	3
22	SW Parking Lot	02/14/2024	02/14/2024	1
23	Excavation Cut & Fill	05/14/2024	06/03/2024	15
24	Place Aggregate Base	06/04/2024	06/11/2024	6
25	Form and Pour Parking Lot Curb	06/12/2024	06/27/2024	12
26	Place Asphalt Base/Surface	06/12/2024	06/21/2024	8
27	Striping & Signage	06/23/2024	07/03/2024	9
28	QC Punchlist	07/03/2024	07/04/2024	2
29	1st Final Walkthrough	07/22/2024	07/23/2024	2
30	Punchlist items	07/24/2024	07/25/2024	2
31	Tennis & SW Parking Lot Completion	07/26/2024	07/26/2024	1
32		02/14/2024	02/14/2024	1
33		02/14/2024	02/14/2024	1
